

Ministère des affaires sociales, de la santé  
et des droits des femmes  
Ministère des finances et des comptes publics  
UNCAM  
Projet FIDES

Réunion du groupe des représentants hospitaliers n° 20

13 novembre 2015

Version 1

# Sommaire

- **Facturation individuelle des ACE**
- **Facturation individuelle des séjours**
- **Groupe réglementation de la facturation**

# VUE GENERALE DE L'AVANCEMENT DU DEPLOIEMENT DES PNL

Total PNL FIDES MCO = 141

PNL FIDES sans ACE = 40

PNL FIDES MCO et ACE = 101

**PNL FIDES MCO et ACE  
SANS DEROGATION**

A déployer pour le 1/9/14 = **79**

**PNL en réel = 53**

PNL déjà inscrits dans les arrêtés pour passage ultérieur en production : 5

**58**

Fin de tests (en attente d'arrêtés) = 4

En pré-production = 11

En phase de préparation de tests = 3

**PNL Non encore engagés = 3**

**76**  
dans le dispositif

**dont**

1 établissement qui sort prochainement du périmètre ex DG  
1 établissement qui sort prochainement du périmètre MCO

**PNL FIDES MCO et ACE  
AVEC DEROGATION**

A déployer pour le 1/9/15 = **22**

**Total PNL en réel = 1**

PNL déjà inscrits dans les arrêtés pour passage ultérieur en production : 1

**2**

Fin de tests (en attente d'arrêtés) = 1

En pré-production = 7

En phase de préparation de tests : 3

**PNL Non encore engagés = 9**

**13**  
dans le dispositif

**dont**

Dont 4 établissements créés en 2015

# VUE GENERALE DE L'AVANCEMENT DU DEPLOIEMENT DES CH

Total CH FIDES MCO = 439

CH FIDES MCO et ACE = 427

409 CH à déployer

CH FIDES MCO et ACE  
Avec dématérialisation des pièces comptables = 201

CH FIDES sans ACE = 12

CH bénéficiant d'une dérogation et non encore engagés = 18

CH FIDES MCO et ACE  
Sans dématérialisation des pièces comptables = 208

CH dont l'éditeur est certifié PES V2 = 207

CH dont l'éditeur est NON certifié PES V2 = 1

Total CH en réel = 125

135

CH déjà inscrits dans les arrêtés pour passage ultérieur en production : 10

Fin de tests (en attente d'arrêt) = 9

En pré-production = 28

En phase de préparation de tests = 18

CH non encore engagés = 11

dont

2 établissements en fusion sans dérogation

Total CH en réel = 37

58

CH déjà inscrits dans les arrêtés pour passage ultérieur en production : 21

Fin de tests (en attente d'arrêt) : 34  
Dont en attente de bascule PESV2 : 29

En pré-production = 36

En phase de préparation de tests = 39

CH non encore engagés = 41

dont

2 établissements en cours de migration SI sans dérogation  
1 établissement qui va sortir prochainement du périmètre ex DG  
1 établissement spécificités GCS en cours de traitement équipe nationale

2CSI

Etablissements prioritaires PES V2 pour la DGOS, la DGFIP, les ARS et les éditeurs

Total CHU/CHR et AP FIDES MCO = 32

Ets bénéficiant d'une dérogation = 1

31 CHU/CHR et AP

A déployer le 1/1/16 pour CHU/CHR  
A déployer le 1/3/16 pour les 3 AP  
Avec dématérialisation des pièces comptables = 29

CHU/CHR  
Sans dématérialisation des pièces comptables = 2

Total CHU/CHR en réel = 7

Fin de tests (en attente d'arrêt) = 0

En pré-production = 14

En phase de préparation de tests = 6

Total CHU/CHR en réel = 0

Fin de tests (en attente d'arrêt) : 0  
Dont en attente de bascule PESV2 : 0

En pré-production = 1

En phase de préparation de tests = 1

CHU/CHR non encore engagés = 2

Dont :  
Chu Guadeloupe  
Chu Martinique

CHU/CHR non encore engagés = 0

2  
7

2

## Bascules FIDES MENSUELLES FIDES (état au 12 octobre 2015)

Mois	n° ARRETE	PNL	CH	CHU/CHR	Total mensuel
FEVRIER	arreté 1	4	14		62
	pilotes	9	30	5	
MARS	arreté 1	7	16		46
	arreté 2	6	17		
AVRIL	arreté 1	1	1		17
	arreté 2		6		
	arreté 3	1	8		
MAI	arreté 1		1		18
	arreté 2	4	3		
	arreté 3	2	5		
	Arreté 4		3		
JUIN	arreté 1		1		19
	arreté 2		1		
	arreté 3	1	3		
	Arreté 4	1	10		
	Arreté 5		2		
JUILLET	arreté 1	1			7
	arreté 3		1		
	Arreté 4		1		
	Arreté 5	1	2		
	Arreté 6		1		
AOUT	Arreté 6	1			1
SEPTEMBRE	arreté 1	1			20
	arreté 2	1	1		
	Arreté 4	2	2		
	Arreté 5		2		
	Arreté 6		2		
	Arreté 7	7	2		
OCTOBRE	arreté 1		3		30
	arreté 3		1		
	Arreté 4		2		
	Arreté 5		1		
	Arreté 6	1	6		
	Arreté 7	2	6		
	Arreté 8	1	7		
	<b>Sous total en production</b>				
NOVEMBRE	Arreté 7		4		29
	Arreté 8	5	13	1	
	Arreté 9	1	5		
DECEMBRE	arreté 1		1		5
	arreté 2		1		
	Arreté 9		3		
JANVIER	Arreté 8			1	5
	Arreté 9		4		
MARS	Arreté 8		1		1
	Arreté 9				
<b>TOTAL</b>		<b>60</b>	<b>193</b>	<b>7</b>	<b>260</b>

# Qualité des données des établissements en production

Données consolidées à fin août 2015 (1 an glissant : 01/09/2014-31/08/2015)

Nombre Etablissements Pilotes	Date des données	Total de factures traitées	Taux de rejet en %	Montant rejet	Délai moyen de facturation (jours)	Délai moyen de paiement (jours)
<b>44</b>	TOTAL AU 31/08/2015	6 701 521	4,5	55 232 453	43	8
	TOTAL AU 30/04/2015	6 349 860	4,5	55 232 453	41	6

Nombre Etablissements Non pilotes	Date des données	Total de factures traitées	Taux de rejet en %	Montant rejet	Délai moyen de facturation (jours)	Délai moyen de paiement (jours)
<b>170</b>	TOTAL AU 31/08/2015	3 206 742	5,4	31 014 044	34	6
	TOTAL AU 30/04/2015	539 426	6,5	6 830 579	31	6

Etude en cours sur les délais de facturation dans le cadre de SIMPHONIE, auprès de 7 établissements publics et PNL équipés des logiciels Mipih et CSIS

# Avancement PES V2 des 990 Etablissements publics de santé (dont 459 EPS MCO également concernés par FIDES)

(source : Fichier généralisation\_V4 du 15/09/15.xlsx)

Date	EPS en production PES V2	EPS en tests PES V2	EPS non démarré en PES V2
Au 31 mai 2015	193 EPS sont en production <i>dont 70 EPS concernés par FIDES</i>	443 EPS ont entamé leur campagne de tests PESV2  <i>dont 225 EPS concernés par FIDES</i>	
Au 12 octobre 2015	284 EPS sont en production <i>dont 115 EPS concernés par FIDES</i>	460 EPS ont entamé leur campagne de tests PESV2  <i>dont 250 EPS concernés par FIDES</i>	162 EPS n'ont pas commencé les tests PESV2  <i>Dont 85 EPS concernés par FIDES</i> - 66 établissements qui doivent faire FIDES d'abord -- 19 établissements qui doivent faire PESV2 d'abord

# Sommaire

- **Facturation individuelle des ACE**
- **Facturation individuelle des séjours**
- **Groupe réglementation de la facturation**

# FIDES séjour et certification des comptes

- L'expérimentation se poursuit de manière tout à fait satisfaisante
- Potentialisation croisée de FIDES séjour et de la **certification des comptes**
  - Nombreuses réserves sur la chaîne des recettes
  - Indispensable renforcement du contrôle interne
    - Formalisation des procédures et documentation
    - Recensement de tous les contrôles existants
    - Place des systèmes d'information et de leurs contrôles embarqués
  - Convergence avec les outils développés pour FIDES séjour
  - Premiers modules « communs » d'ici la fin de l'année

## FIDES séjour – Suivi des axes de travail pour 2015

- Reprendre des **tests de flux** en direction des CPU : 4 établissements à date, un 5<sup>e</sup> attend le feu vert de sa CPU
- Mettre en place au sein des établissements de santé expérimentateurs un environnement de **simulation des impacts financiers** pour définir les critères de paramétrage du levier financier
- Accompagner les établissements de santé dans la mise en place de l'environnement de **pilotage du processus de facturation** : flux de données entre le module de contrôle et d'analyse (MOCA) et le moteur de facturation DEFIS afin de consolider les retours d'expérience des DIM : les trois premières chaînes de production sont opérationnelles

# FIDES Séjours - Tests de flux – des travaux bien engagés

## ■ Editeur Mipih

- Les principaux problèmes des flux de données administratives envoyées par la GAP ont été réglés
- L'envoi du 07/09/2015 du CHU de Montpellier se traduit par un taux de rejet de 5,1% dont les causes sont en cours d'analyse
- Les travaux de Montpellier ont par ailleurs permis de soulever quelques problèmes de DEFIS qui sont en cours de qualification avec l'ATIH

## ■ Editeur Agfa

- Premier flux du CH de Montargis en cours pour analyse lors du GCL du 7 octobre

## ■ Editeur McKesson

- Feu vert de la CPU pour le premier flux du CH de Niort qui est prêt depuis plusieurs mois


## ■ Editeur Cerner

- Reprise des travaux par Cerner avec le PNL CLCC Baclesse pour un premier flux envisagé avant la fin de l'année

## ■ Editeur Cpage

- En attente de planning de fin des travaux et du choix d'un établissement pilote

# Calendrier et avancement des axes de travail

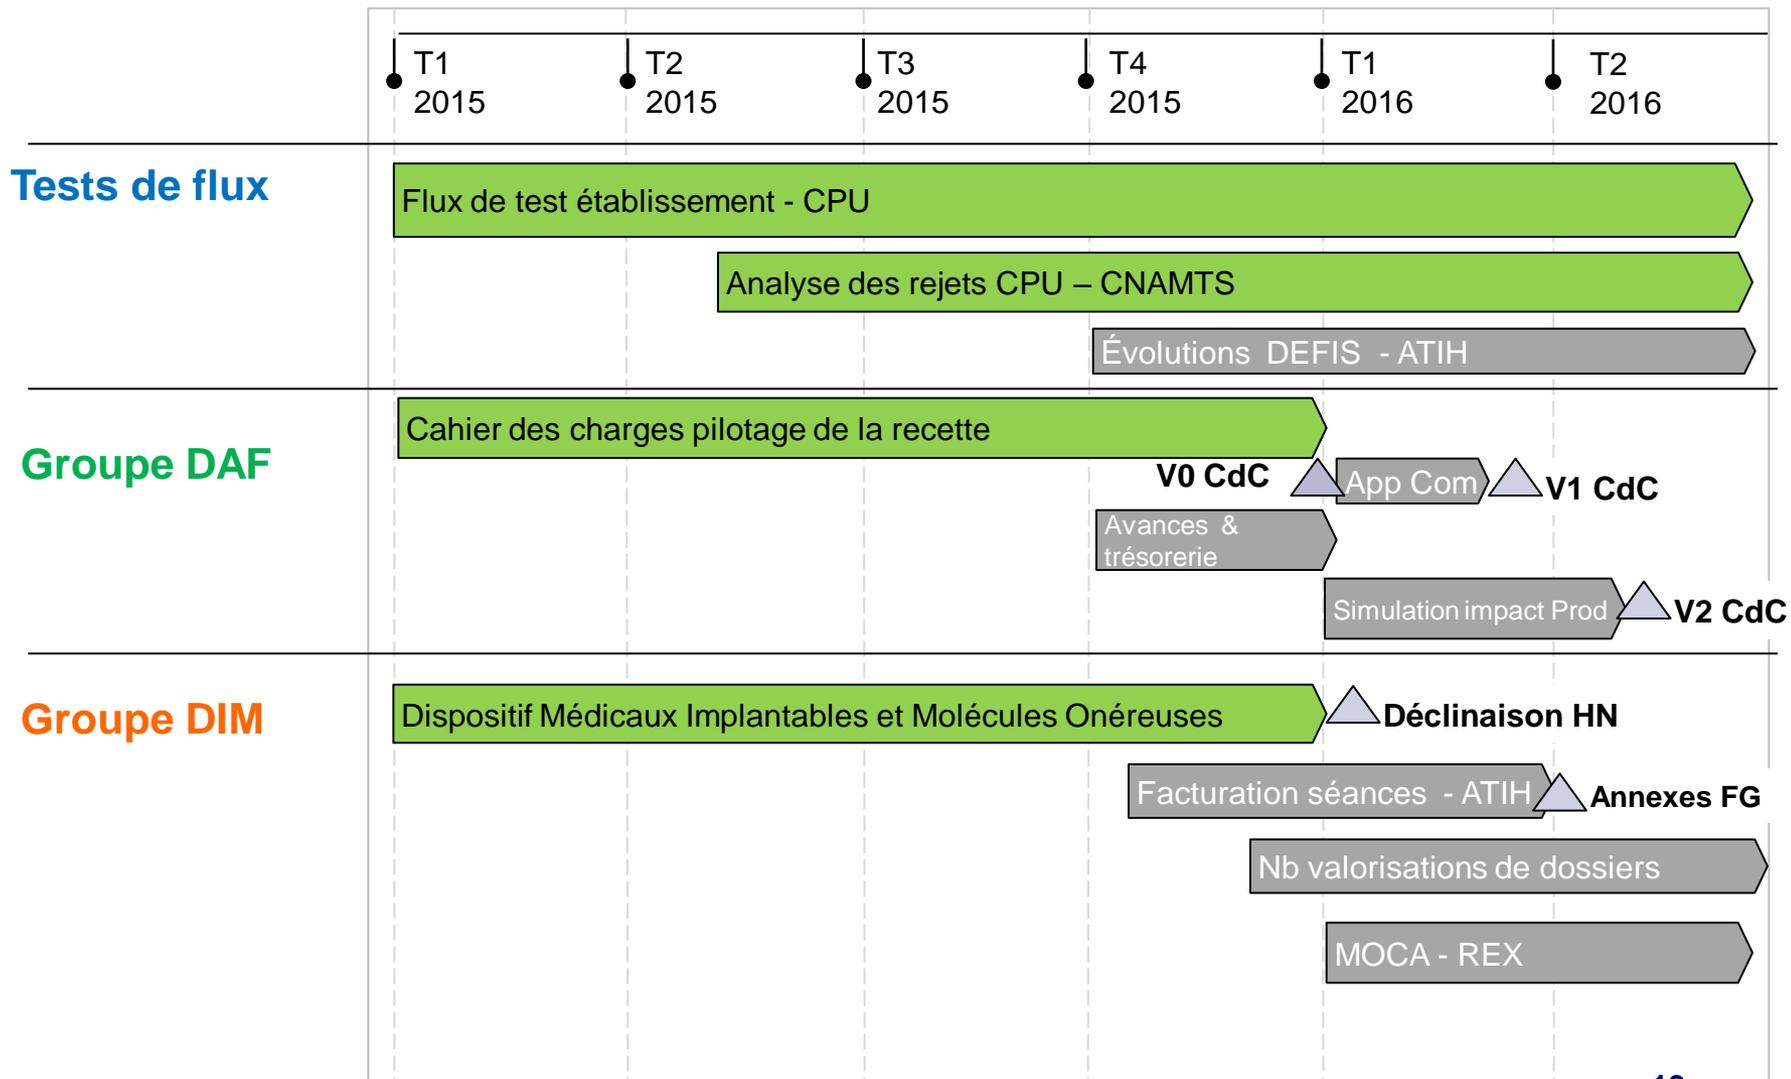

# Sommaire

- **Facturation individuelle des ACE**
- **Facturation individuelle des séjours**
- **Groupe réglementation de la facturation**

# Groupe réglementation de la facturation

- **Rappel** : pour terminer la mise en œuvre de FIDES ACE il reste à engager une deuxième phase : celle concernant les prises en charges associées aux **forfaits** ATU (urgences) FFM (certaines prestations médicales) SE et APE (certaines activités de plateau technique)
- Il s'agit de prestations d'hospitalisation délivrées en consultation externe dont les conditions de facturation dépendent d'une décision de l'UNCAM attendue depuis 5 ans
- **Le DCE est paru le 23 juillet 2015**
  - **L'UNCAM a rendu son avis le 17 septembre 2015 – Taux du TM = 20%**
  - **La fin de la possibilité de facturer des actes infirmiers aux urgences prendra effet au 1<sup>er</sup> octobre 2015**
- **Décision du 17/09/2015 est parue au JO le 06/10/2015**
  - **Dès parution, les forfaits, dont urgence, et leurs actes associés, sont payés par l'ensemble des caisses dans les contextes CMUc et migrants**
  - **Obligation d'une première phase de certification CNDA du logiciel de GAP pour une mise en œuvre des flux CMUc et migrants**
  - **Dès certification définitive, mise en œuvre d'une expérimentation sur les activités à forfait avant intégration de ces prises en charge à FIDES**
